



Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt / Fachstelle Lärmschutz

Strassenlärmsanierung

Standbericht BAFU
Programmvereinbarung PV2 / 3

ERFA-Tagung Lärm, 7. Mai 2015, Zürich
Silvio Grauwiller



 Fachstelle Lärmschutz

Inhalt

- Standbericht per 31.12.2014
- Programmvereinbarung 2012-2015
- Programmvereinbarung 2016-2018

- Informationen über den Stand der Arbeiten

Standbericht 31.12.2014

- Erhebung im bekannten Stil, aber mit zusätzlicher Q-Sicherung
- Datenbasis unverändert
(Staatsstrassen in Landgemeinden, Städte ZUE/WIN, LSW-Ausführung P+R, Gemeindestrassen)
- Angaben auf Stufe Projekt (Gemeinde, Kreis, Strassenabschnitt ...)
- Angaben zu Kosten, Massnahmenumfang und Wirkung

- Verarbeitung durch PM Preisig AG
- Aufbereitung mit LaermDB und Excel-Tabellen

- Abgabe an BAFU ist Mitte April 2015 erfolgt
- Daten dienen auch als Grundlage für Planung PV3

Stand per 31.12.14

Kanton / FALS: Staatsstrassen

- In 17 Regionen mit rund 145 Gemeinden laufen akustische Projekte
 - Zahlreiche Projekte mit laufendem SSF-Einbau
 - LSW-Realisierung durch P+R in diversen Projekten
 - Rückerstattungen für SSF und LSW

 - Erste (SSF-) Projekte abgeschlossen

 - **Projektfortschritt 2014 erfreulich – LSW-Realisierung "greift"**
-
- *letzte Regionen (WEL, SLS) submittiert, Vergabe läuft*
 - *zahlreiche Projektabschlüsse (SSF) und Projektauflagen erwartet*

Stand per 31.12.14

Stadt Zürich

- LSW und Lückenschliessungen abschliessend definiert; entsprechende AkP sind vergeben und in Arbeit (Bauprojekte)
- T30-Prüfung auf ganzem Strassennetz; zahlreiche T30-Projekte vorgesehen; praktisch gegen alle sind Einsprachen eingegangen
- Gleiches gilt für T30-nachts-Teststrecken
- SSF-Projekte mehrheitlich blockiert (da idR mit T30-Massnahmen gekoppelt); zudem offene Fragen der Zuständigkeit und Ressourcen
- **Projektfortschritt (Realisierung) vielerorts blockiert**

-
- *Projektauflagen Stadtkreise 3 und 6 (Januar 2015)*
 - *Projektauflagen Stadtkreise 8 und 12 (Juni 2015)*

Stand per 31.12.14

Stadt Winterthur

- Projekte an überkommunalen Strassen (7 Lose): keine Einsprachen / Realisierung läuft
- Prüfung T30 an kommunalen Strassen läuft
- Projekte an kommunalen Strassen, Startzeitpunkt noch offen, kaum LSW-Projekte zu erwarten
- **Plangemässer Projektfortschritt**

-
- *Projektierung und Realisierung an kommunalen Strassen vorantreiben*

Stand per 31.12.13

Gemeindestrassen in Landgemeinden

- Zahlreiche Lärmsanierungsprojekte an Gemeindestrassen gemeldet.
- Prognosen aktualisiert
- Umfang übersteigt ggw. die ursprüngliche Abschätzung der FALS
- **Erfreuliche Aktivität an den Gemeindestrassen**
(Projektfortschritt kann aber nicht näher beurteilt werden)

Stand per 31.12.14

Programmvereinbarung 2012-2015 (PV2)

Umfang der PV2 wurde in Absprache mit BAFU deutlich reduziert
(aufgrund des deutlichen Rückstands der Ende 2013 bestand)

Ergebnis per 31.12.2014


| Indikator | Ziel PV2 (2012-2015) | Ziel PV2 (2012-2015) mit Anpassung 2014 | Stand E 2014 (nach 2 von 3 Jahren*) |
|------------------------------|-------------------------|---|--|
| LSW: geschützte Personen | 3'850 | 2'000 | 1'678 |
| LSW: Bundesbeiträge | 4.376 Mio | 2.5 Mio | 4.2 Mio |
| SSF: eingebaute Fenster | 41'560 | 20'000 | 7'736 |
| SSF: Bundesbeiträge | 16.624 Mio | 8.0 Mio | 3.1 Mio |
| | | | |
| (ca.) Gesamtkosten | 80 – 90 Mio | 40 – 45 Mio | 33.8 Mio |
| zu erwartende Bundesbeiträge | | | 7.3 Mio |

* da 2012 als Nachbesserung für PV1 diente, war 2014 das zweite von drei Jahren, die zur PV2 zählen

Projektstand Übersicht (nach Losen)



Projektstand Übersicht (nach Gemeinde)

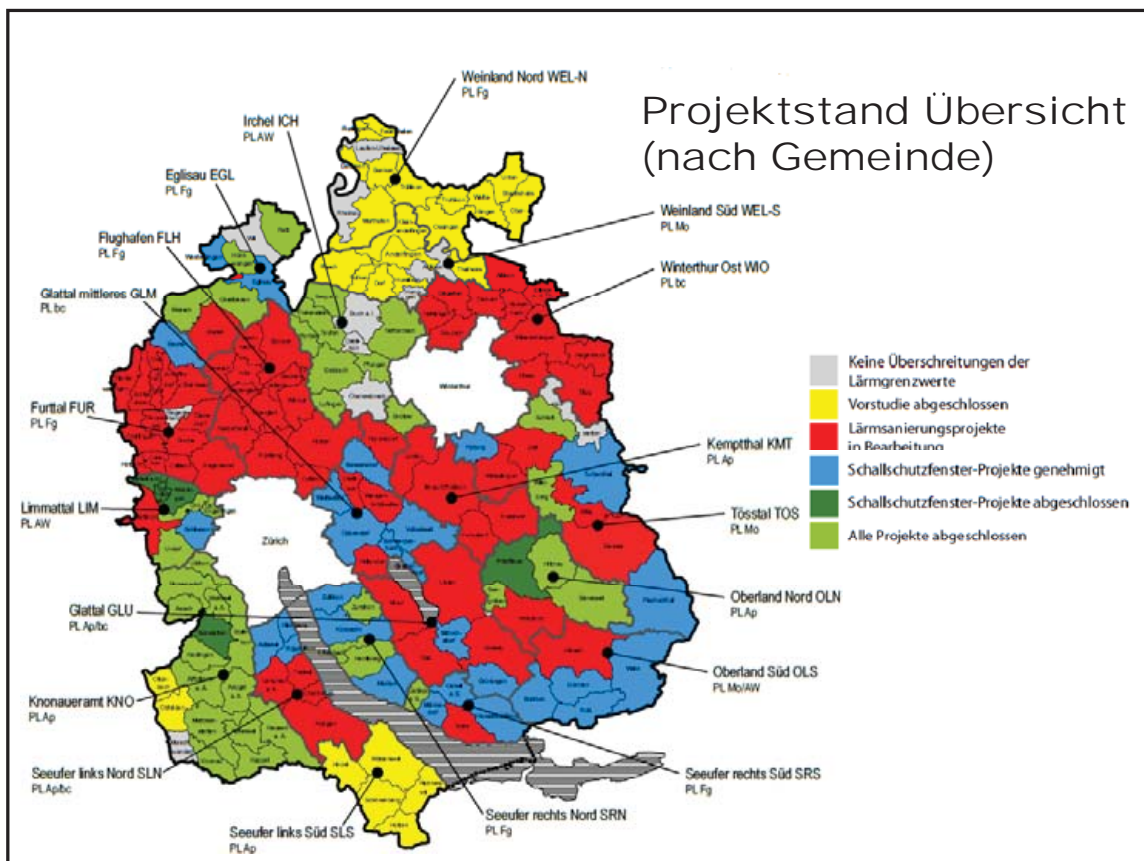

Programmvereinbarung 2016-2018 (PV3)

- Eingabe des Kantons ist erfolgt (Vorschlag)
- Erste Verhandlungsrunde bis Ende Juli 2015
- Programmabschluss bis 31. Dezember 2015

- Vorschlag Kanton:
 - 2000 geschützte Personen
 - 20 Mio. CHF Bundesbeitrag
 - 80 - 90 Mio. Gesamtumsatz

Basis Leistungswerte 2013/2014 und Prognosen gemäss Standbericht

PV3 – bekannte Details

- Neue "Basis": Handbuch NFA
auf der Homepage der BAFU verfügbar
 - ° Beitrag an Schallschutzfenster (bleibt bei) Fr. 400
 - ° alle Massnahmen an der Quelle werden zu 32% subventioniert
 - ° Binderschicht der Beläge wird subventioniert

- Dauer der PV3 – 1. Januar bis 31. März 2018
1. April 2018 bis 31. März 2019 = Nachbesserungsjahr zum
Abschluss in der PV3 angemeldeten Projekte

- Auch nach 2018 bleibt die Lärmsanierung eine Aufgabe der
Anlagehalter, aber es kann nicht mehr mit Bundesgeldern
gerechnet werden



Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt / Fachstelle Lärmschutz

Wir sind voll in Fahrt
und lassen uns nicht
bremsen.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020



Besten Dank
für Ihre Aufmerksamkeit
